

Beispielbericht Schallkamas H-Serie



Auftraggeber

Kunde
Adresse
PLZ Ort

Ortungsbereich

Produktion

Ansprechspartner vor Ort

Vorname Nachname

> FIRMENLOGO <

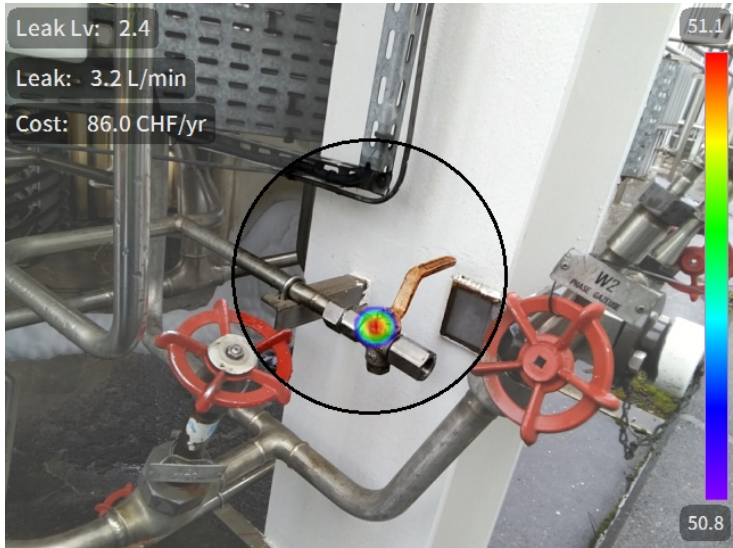
Inhaltsverzeichnis (Dateiname)	Seite
2025-02-26_0008.jpg	4
2025-05-07_0013.jpg	4
2025-07-10_0011.jpg	5
2026-03-18_0071_Wasserstoff.jpg	5
2026-03-18_0081_Argon.jpg	6

> FIRMENLOGO <

Einsparpotenzial / Verluste (geschätzt)

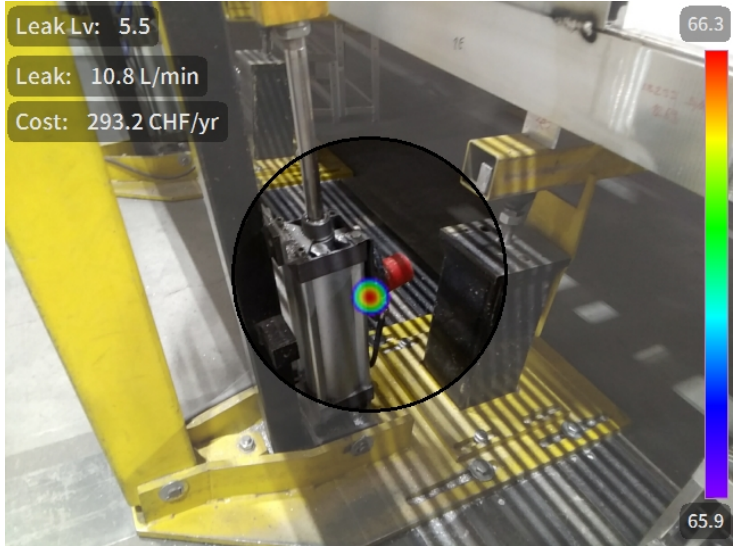
Dateiname	Leckrate l/min.	Verlust CHF/Jahr
2025-02-26_0008.jpg	3	86
2025-05-07_0013.jpg	13	187
2025-07-10_0011.jpg	11	293
2026-03-18_0071_Wasserstoff.jpg	2	18695
2026-03-18_0081_Argon.jpg	3	41049
TOTAL	32	60311

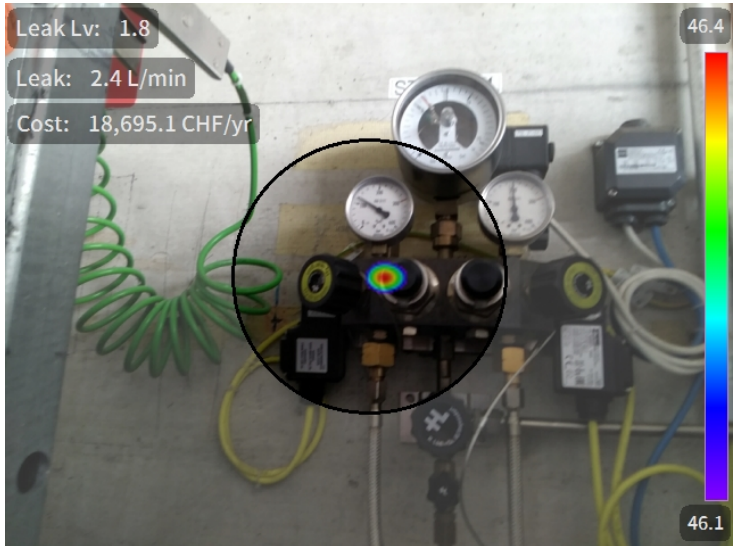
> FIRMENLOGO <

Leckageort	Verteilstation Aussen
Komponente	Probeentnahmehahn Säule W2
Verlust	3 l/min, CHF 86.- / Jahr
Dateiname	2025-02-26_0008.jpg
Bemerkung	Leckage an Verschraubung Kupplung zu Absperrhahn
Bild	

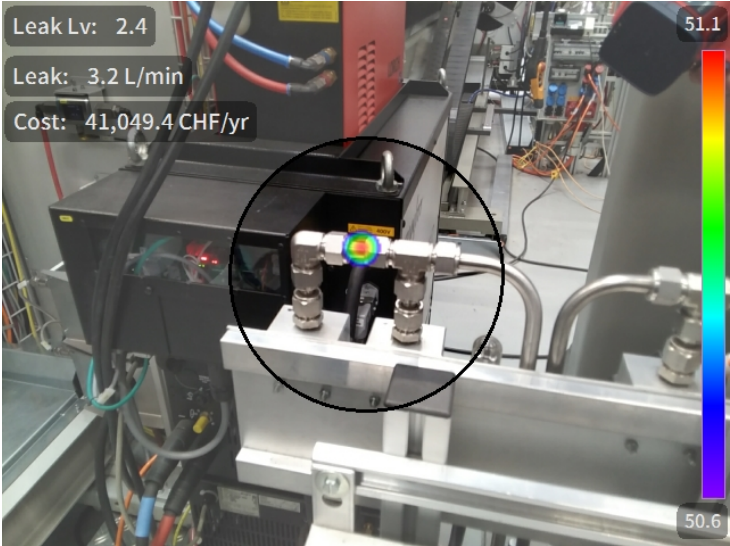
Leckageort	Halle 2, Vorschub A
Komponente	Nivelierung 2
Verlust	13 l/min, CHF 187.- / Jahr
Dateiname	2025-05-07_0013.jpg
Bemerkung	Leckage vermutlich oben an der Komponente
Bild	

> FIRMENLOGO <

Leckageort	Montagehalle 2, Schiff 3
Komponente	Zylinder 5
Verlust	11 l/min, CHF 293.- / Jahr
Dateiname	2025-07-10_0011.jpg
Bemerkung	Leckage hinten an der Komponente
Bild	

Leckageort	H2
Komponente	Anschluss
Verlust	2 l/min, CHF 18695.- / Jahr
Dateiname	2026-03-18_0071_Wasserstoff.jpg
Bemerkung	Wasserstoff
Bild	

> FIRMENLOGO <

Leckageort	Produktion
Komponente	Verteiler
Verlust	3 l/min, CHF 41049.- / Jahr
Dateiname	2026-03-18_0081_Argon.jpg
Bemerkung	Argon
Bild	 Leak Lv: 2.4 Leak: 3.2 L/min Cost: 41,049.4 CHF/yr
